




# 上宸工程设计集团有限公司

## 设计变更联系单

项目名称	溪山亭苑	子项名称		第01页	共01页
主送单位	黄山市新徽投资有限公司		抄送单位		
<p>溪山亭苑项目工程17#楼，由于位于红线边缘毗邻村民地块，且现场地形高差过大，另需建设排水沟及围墙，经现场复测且与建设单位沟通协商后，将原17#楼的位置向北微调，调整后建筑退让间距17#与18#最窄处11.81米满足规范要求，17#与红线间距也满足规范要求，详见附件17#楼定位调整。</p> <p>溪山亭苑项目工程14#楼、15#楼、16#楼由于在上门村村民住户和山体脚部之间建设，为尽可能的不扰动村民民房，减少山体破坏，保留山体等原因，经现场复测且与建设单位沟通协商后，该项目西侧道路部分标高微调，14#楼、15#楼、16#楼正负零标高也进行相应微调，14#楼正负零竖向由原设计131.15调整为132.60、15#楼正负零竖向由原设计33.60调整为135.15、16#楼正负零竖向由原设计135.15调整为135.15和134.30，详见附件14#~16#楼竖向调整。</p>					
设计	夏思彤	校核	刘静	专业负责人	王开

上宸工程设计集团有限公司  
2024年8月14日

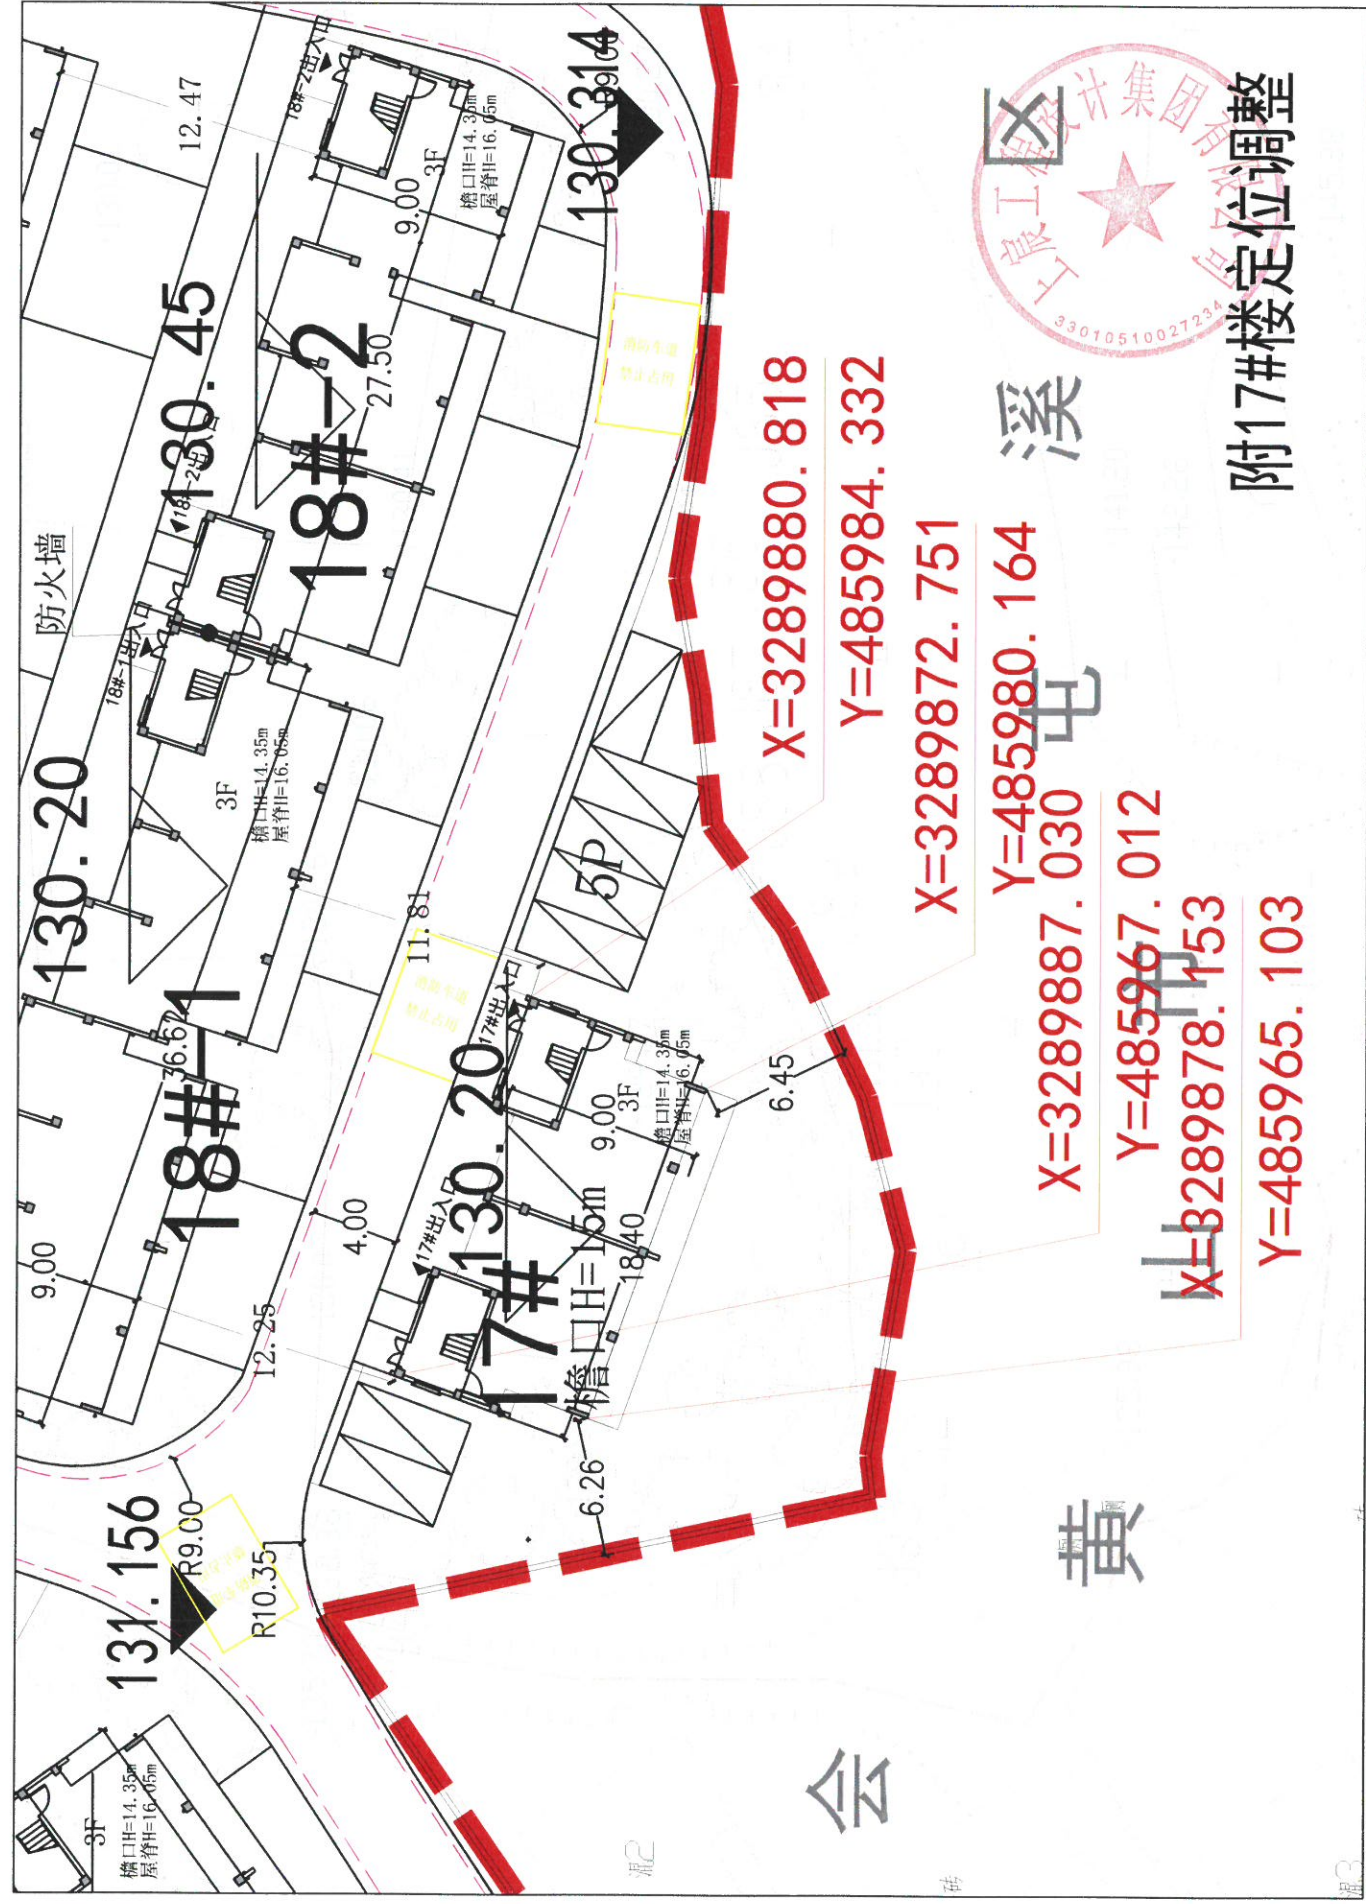

黄

会



附17#楼定位调整

X=3289880.818

Y=485984.332

X=3289872.751

Y=485980.164

溪

X=3289887.030

Y=485967.012

X=3289878.153

Y=485965.103

屯

