新建南昌经景德镇至黄山铁路安徽段铺轨便线临时用地土地复垦竣工图

39620.201　　39620.691
3299.338　　3299.338

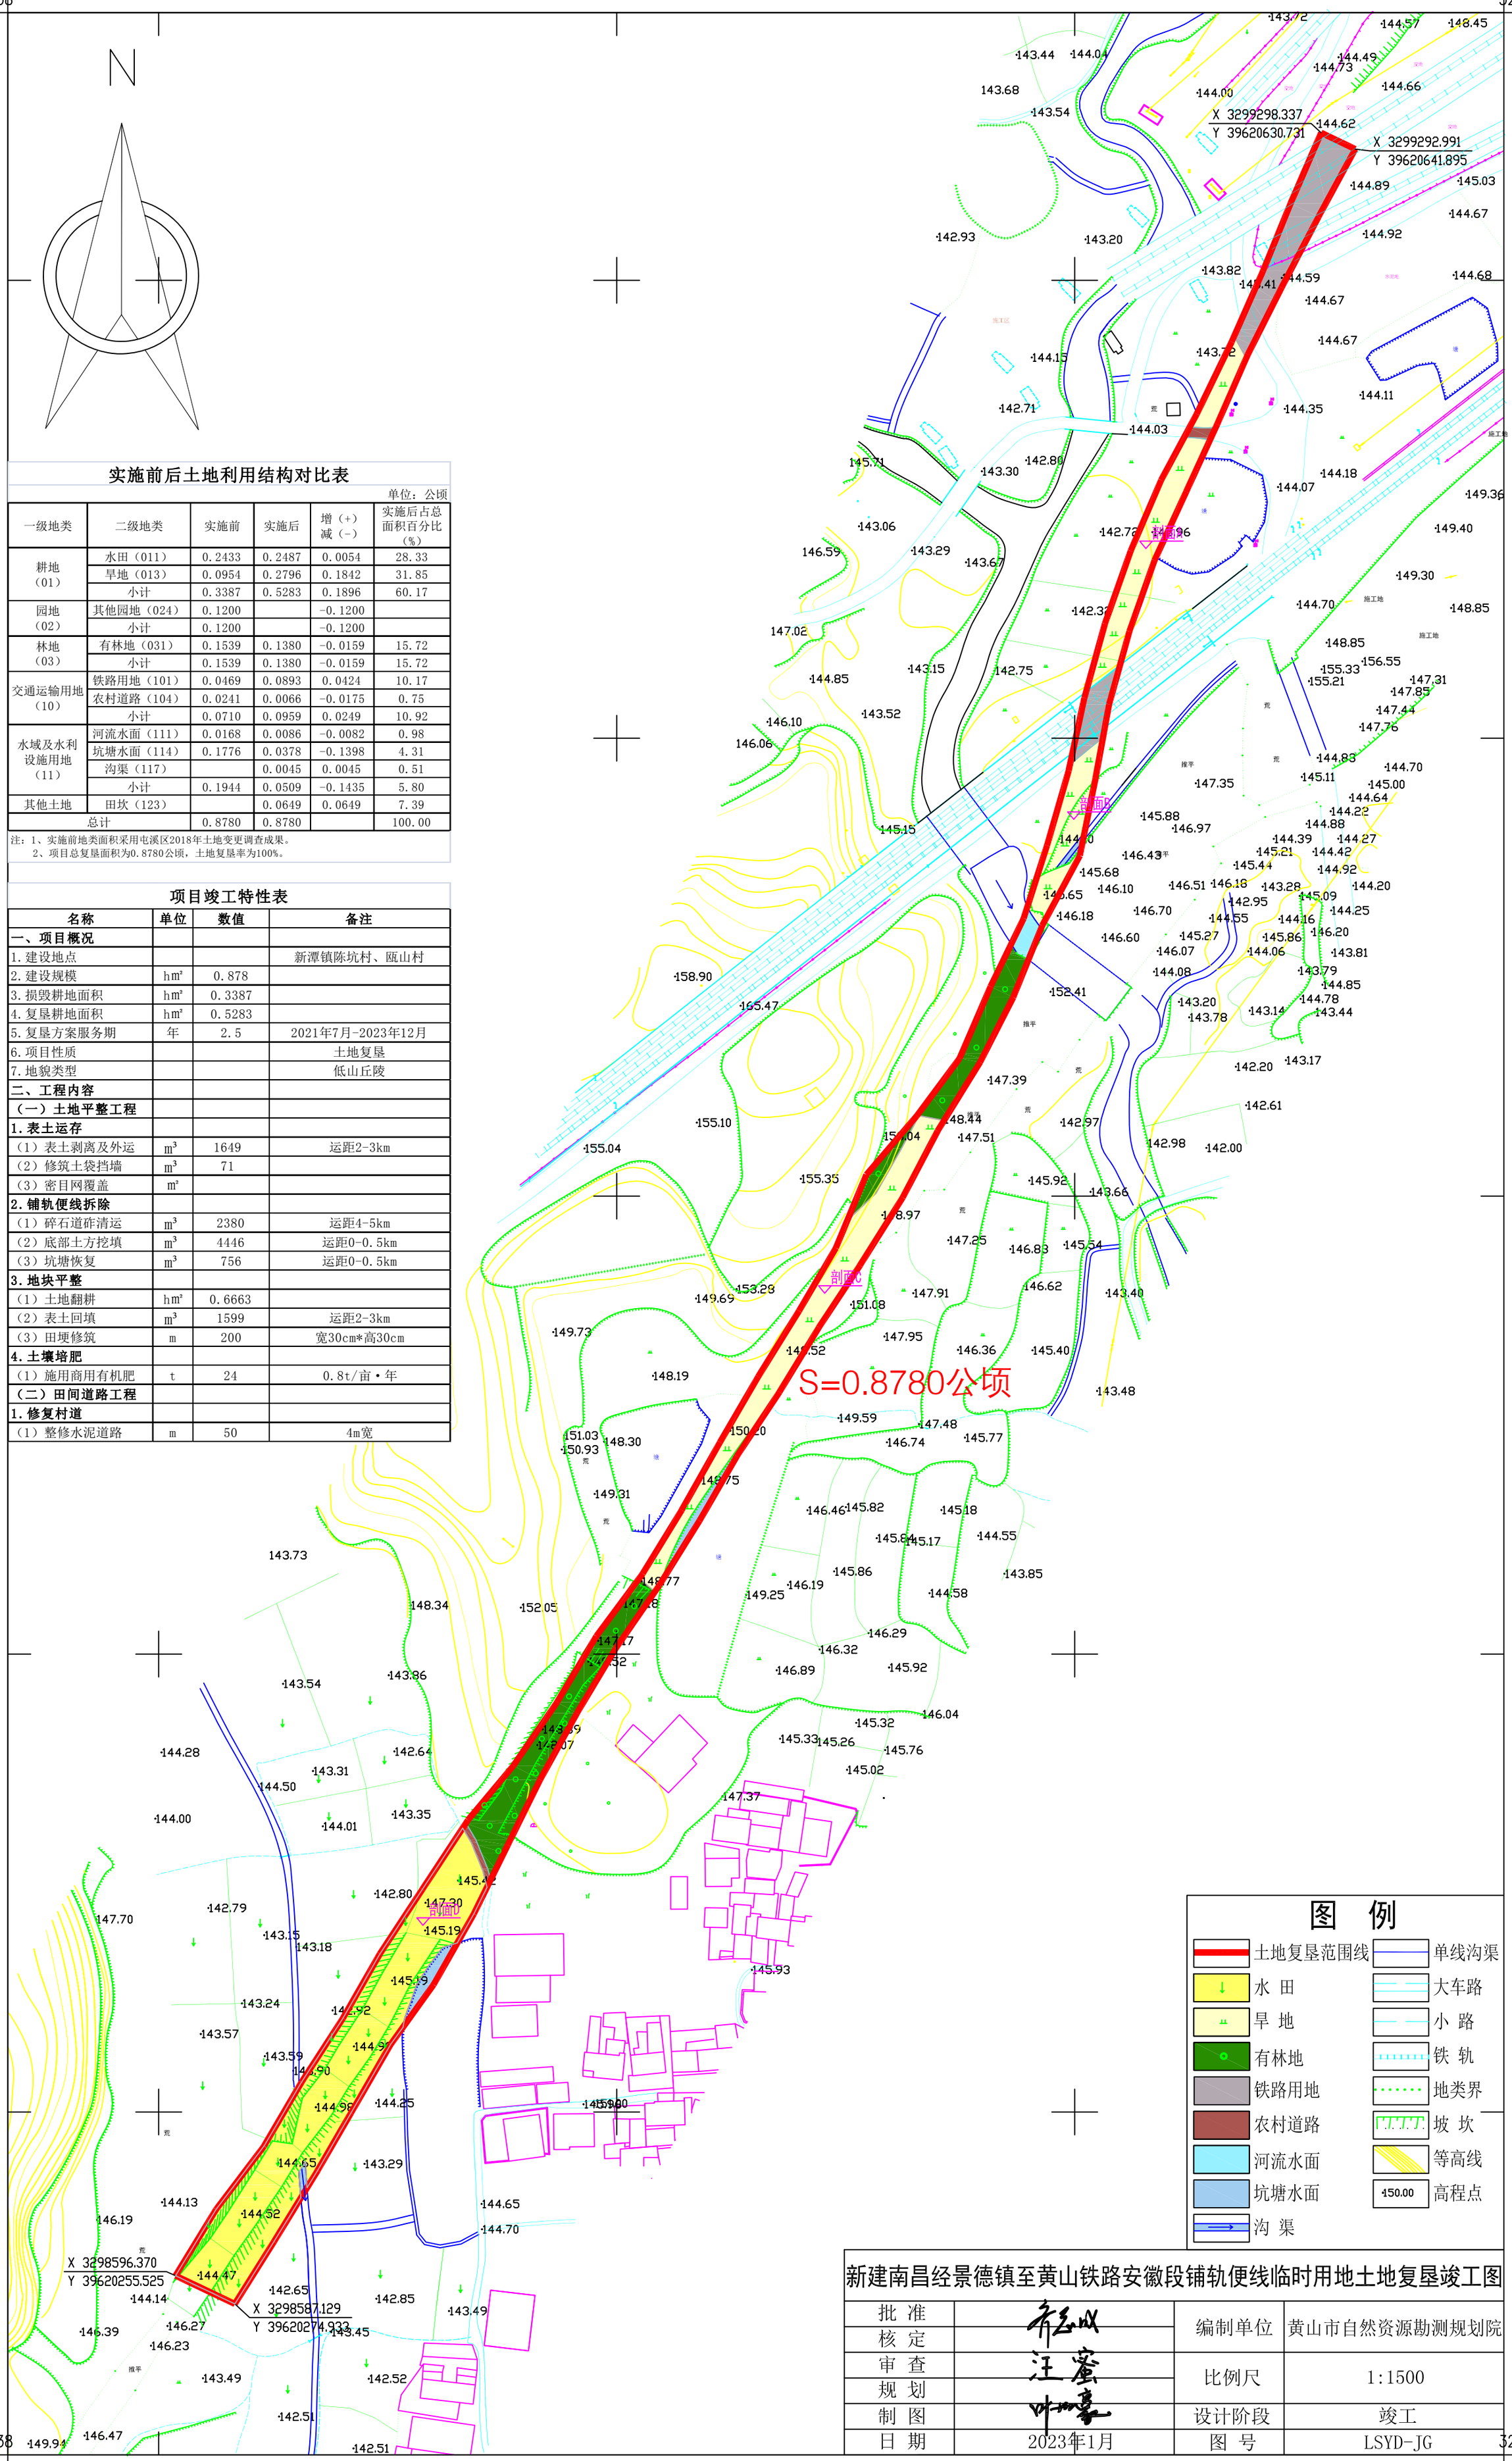

实施前后土地利用结构对比表

单位：公顷

一级地类	二级地类	实施前	实施后	增（+）减（-）	实施后占总面积百分比（%）
耕地（01）	水田（011）	0.2433	0.2487	0.0054	28.33
	旱地（013）	0.0954	0.2796	0.1842	31.85
	小计	0.3387	0.5283	0.1896	60.17
园地（02）	其他园地（024）	0.1200		-0.1200	
	小计	0.1200		-0.1200	
林地（03）	有林地（031）	0.1539	0.1380	-0.0159	15.72
	小计	0.1539	0.1380	-0.0159	15.72
交通运输用地（10）	铁路用地（101）	0.0469	0.0893	0.0424	10.17
	农村道路（104）	0.0241	0.0066	-0.0175	0.75
	小计	0.0710	0.0959	0.0249	10.92
水域及水利设施用地（11）	河流水面（111）	0.0168	0.0086	-0.0082	0.98
	坑塘水面（114）	0.1776	0.0378	-0.1398	4.31
	沟渠（117）		0.0045	0.0045	0.51
	小计	0.1944	0.0509	-0.1435	5.80
其他土地	田坎（123）		0.0649	0.0649	7.39
总计		0.8780	0.8780		100.00

注：1、实施前地类面积采用屯溪区2018年土地变更调查成果。
2、项目总复垦面积为0.8780公顷，土地复垦率为100%。

项目竣工特性表

名称	单位	数值	备注
一、项目概况			
1.建设地点			新潭镇陈坑村、瓯山村
2.建设规模	hm²	0.878	
3.损毁耕地面积	hm²	0.3387	
4.复垦耕地面积	hm²	0.5283	
5.复垦方案服务期	年	2.5	2021年7月-2023年12月
6.项目性质			土地复垦
7.地貌类型			低山丘陵
二、工程内容			
（一）土地平整工程			
1.表土运存			
（1）表土剥离及外运	m³	1649	运距2-3km
（2）修筑土袋挡墙	m³	71	
（3）密目网覆盖	m²		
2.铺轨便线拆除			
（1）碎石道砟清运	m³	2380	运距4-5km
（2）底部土方挖填	m³	4446	运距0-0.5km
（3）坑塘恢复	m³	756	运距0-0.5km
3.地块平整			
（1）土地翻耕	hm²	0.6663	
（2）表土回填	m³	1599	运距2-3km
（3）田埂修筑	m	200	宽30cm*高30cm
4.土壤培肥			
（1）施用商用有机肥	t	24	0.8t/亩·年
（二）田间道路工程			
1.修复村道			
（1）整修水泥道路	m	50	4m宽

图　例

- 土地复垦范围线
- 水　田
- 旱　地
- 有林地
- 铁路用地
- 农村道路
- 河流水面
- 坑塘水面
- 沟　渠
- 单线沟渠
- 大车路
- 小　路
- 铁　轨
- 地类界
- 坡　坎
- 等高线
- 150.00 高程点

新建南昌经景德镇至黄山铁路安徽段铺轨便线临时用地土地复垦竣工图			
批　准		编制单位	黄山市自然资源勘测规划院
核　定			
审　查		比例尺	1:1500
规　划			
制　图		设计阶段	竣工
日　期	2023年1月	图　号	LSYD-JG

3298.538　　3298.538
39620.201　　39620.691

2000国家大地坐标系
1985国家高程基准

1:1500
